Sprint Planning

Projeto Laboratório III 2026/2027 · Hotel4You · Grupo 2
Sprint 3 (26/10/2026 a 02/11/2026) · Reservas, quartos, serviços extra e coerência técnica · 26 story points

- ✅ Lista de verificação de planeamento do sprint
- 👥 Membros da equipa do sprint
- ✏️ Itens da reunião de planeamento do sprint
  - Agenda
  - Resumo do sprint anterior
  - Detalhes
  - Possíveis riscos
- 📚 Recursos de planeamento do sprint
  - Quadros e retrospetivas de sprint
  - Recursos e definições da equipa

✅ Lista de verificação de planeamento do sprint

Preparação	Reunião	Acompanhamento
Rever o feedback da Sprint Review 2 Escrever as user stories e os critérios de aceitação Separar os critérios de aceitação das tarefas Ordenar o backlog por prioridade Atualizar os diagramas consoante a review 2	Definir a meta da Sprint 3 Dividir as stories pela disponibilidade Acordar dependências e prazos Planear as alterações dos diagramas	Daily Scrum na aula de 28/10 Atualizar o Trello todos os dias Trabalho da semana na main até 30/10 PR da main para a Quality a 02/11

👥 Membros da equipa do sprint

Nome	Função
Dinis Wang	Team Leader (Scrum Master e Product Owner) Disponível nas aulas e ao fim de semana · US32, US33 · ~6 h + validação das stories da equipa
Guilherme Pereira	Developer Disponível durante a semana e ao fim de semana · US25, US26 · ~8 h
Tomás Castro	Developer Disponível durante a semana e ao fim de semana · US27, US28 · ~10 h
Nuno Magalhães	Developer Disponível nas aulas e ao fim de semana · US31, US29, US30 · revisão do SQL de todos os PRs · ~11 h

✏️ Itens da reunião de planeamento do sprint

Objetivo da Sprint 3: no fim da sprint, o rececionista consegue criar, consultar e alterar reservas e o gestor consegue cancelá-las; o gestor gere os serviços extra e ativa ou desativa quartos; a aplicação valida o ficheiro XML de uma entrega de fornecedor; e os nomes das classes e os diagramas ficam coerentes com o código.

Definition of Ready (DoR): uma user story só entra numa sprint se estiver no formato “Como… quero… para…”, tiver critérios de aceitação verificáveis do ponto de vista do utilizador, estiver estimada em story points, tiver prioridade e responsável e não tiver dependências por resolver.

Definition of Done (DoD): cumpre os critérios de aceitação; as tarefas da story estão feitas (view FXML, testes unitários e Javadoc); foi feita numa branch feat0XX-descrição e entrou na main por um pull request revisto por outro elemento, que descreve o que foi testado; compila e os testes unitários passam (mvn test); os imports não usados foram removidos e o module-info.java só muda se for necessário; se existirem mudanças no modelo, os diagramas são atualizados; o cartão está em Done no Trello.

Perfis e papéis: o gestor administra o hotel (contas, tarifas, quartos, serviços extra e cancelamentos); o rececionista atende os clientes e gere as reservas; “funcionário” designa qualquer um dos dois; o fornecedor não usa a aplicação, apenas entrega o ficheiro XML.

Tarefas de cada story: todos os cartões têm uma checklist de tarefas fixa (view FXML, testes unitários e Javadoc), separada da checklist de critérios de aceitação. Os testes da DAL cobrem inserir, consultar, atualizar e apagar, e limpam os dados que criam.

Resumo do sprint anterior

Tema do sprint	**Sprint 2: primeira versão funcional (MVC, base de dados, login, clientes, quartos, tarifas e contas)**
Pontos da história	35 concluídos de 35 planeados
Resumo	**Concluídas: US07 a US22 (esqueleto técnico, tabelas, login e menu por perfil, registo, pesquisa e edição de clientes, consulta de quartos e disponibilidade, alteração de tarifas, criação e desativação de contas, diagramas e Javadoc). A aplicação funciona sobre o SQL Server, com a estrutura MVC e testes unitários da lógica de negócio. Dois critérios foram ajustados na prática: na US15 o número de funcionário é gerado pela aplicação e na US22 a lista mostra contas de utilizador.** Feedback do docente: a sprint foi ambiciosa e as dependências entre stories foram a principal dificuldade; os testes unitários, o Javadoc e a view devem ser tarefas de cada story e não critérios; é preciso clarificar os perfis e os papéis das stories; devem guardar-se provas do planeamento (prints do Trello) e considerar um único ecrã de clientes (lista, registo e edição). Ações: tarefas fixas em cada cartão, glossário de perfis, dependências tratadas com a interface IReservaDAL no primeiro dia e prints do quadro no início e no fim da sprint.

Agenda

1. Feedback da Sprint Review 2 e resultado da Sprint 2 (5 min)

2. Meta da Sprint 3 e disponibilidade de cada elemento (5 min)

3. Revisão das user stories e dos critérios de aceitação, com estimativa por Planning Poker (15 min)

4. Capacidade, divisão por elemento e dependências (10 min)

5. Riscos, regras de Git flow e próximos passos (5 min)

6. Confirmação do compromisso (5 min)

Duração total: 45 min · **Facilitador:** Dinis Wang (Team Leader) · **Notas:** Guilherme Pereira

Detalhes

Data de início	26/10/2026 (segunda-feira)
Data de término	02/11/2026 (segunda-feira, Sprint Review)
Tema do sprint	Reservas, quartos, serviços extra e coerência técnica
Duração	1 semana
Disponibilidade	Guilherme e Tomás durante a semana e ao fim de semana; Dinis e Nuno nas aulas e ao fim de semana; os 4 nas aulas. O trabalho de que os outros dependem faz-se durante a semana; ao fim de semana fazem-se as stories de que ninguém depende.
Capacidade da equipa	4 elementos × 12 h = 48 h · reserva de 6 h para imprevistos = 42 h efetivas
Compromisso	**9 user stories · 26 story points · 35 h de tarefas planeadas** Stories extra: US23 e US24, 4 story points.
Velocidade da Sprint 2	35 story points concluídos de 35 planeados Todas as stories da Sprint 2 (US07 a US22) foram concluídas.
Escala de estimativa	Story points em Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13) com Planning Poker Prioridade: High, Medium e Low, igual à do Trello.

Possíveis riscos

Risco · probabilidade e impacto	Mitigação

A US29 e a US30 dependem da base de reservas da US27. Probabilidade: alta · Impacto: alto	O Tomás publica a interface IReservaDAL no primeiro dia; as outras stories escrevem a BLL e os testes contra uma DAL falsa e ligam a real quando estiver na main (sexta).
O rename das classes (US32) cria conflitos com PRs abertos. Probabilidade: média · Impacto: alto	Fazê-lo na terça de manhã, num só PR, com merge no mesmo dia, enquanto os outros começam por ficheiros novos.
Falta o XML de exemplo e o XSD para a US26. Probabilidade: média · Impacto: médio	Pedidos ao docente; se não chegarem até quarta, a US26 sai e entra a US23.
A revisão dos PRs concentra-se numa só pessoa. Probabilidade: alta · Impacto: médio	Dois revisores por rotação; PRs pequenos; o Nuno revê o SQL.
Os testes criam dados na base partilhada, que não se apagam. Probabilidade: média · Impacto: baixo	Contas de teste com o prefixo teste. e sempre desativadas; testes da DAL limpam o que criam.
A US31 mexe no Quarto. Probabilidade: baixa · Impacto: médio	Só começa depois do rename.

Sprint Backlog: user stories

Stories acordadas para a Sprint 3. Cada story corresponde a um cartão no Trello, com os critérios de aceitação numa checklist e as tarefas de codificação (view FXML, testes unitários e Javadoc) noutra.

ID	User story e critérios de aceitação	Pontos	Prioridade	Responsável
US27	Como **rececionista**, quero criar uma reserva para um cliente num quarto livre, para que as datas fiquem garantidas. Critérios de aceitação: o cliente é escolhido pelo NIF e tem de existir; só são oferecidos quartos livres nas datas, com capacidade para o número de hóspedes; a entrada não pode ser no passado e a saída tem de ser posterior à entrada; mostra o preço total (noites × preço por noite do quarto) antes de confirmar; não é possível reservar um quarto já reservado em datas que se sobrepõem; a reserva fica guardada com o estado CONFIRMADA.	5	High	Tomás
US28	Como **rececionista**, quero consultar as reservas de um cliente, para que o possa informar do estado de cada uma. Critérios de aceitação: a pesquisa é pelo NIF e um NIF com formato inválido dá erro antes de pesquisar; a lista mostra o quarto, as datas, o estado e o preço total; as reservas mais recentes aparecem primeiro; um cliente sem reservas mostra uma mensagem clara.	2	High	Tomás
US29	Como **gestor**, quero cancelar uma reserva, para que o quarto fique livre para outros clientes. Critérios de aceitação: só o gestor tem acesso; só é possível cancelar se o check-in ainda não foi feito; a reserva passa a CANCELADA e deixa de ocupar o quarto (volta a aparecer na pesquisa); a reserva não é apagada, fica no histórico.	3	Medium	Nuno
US30	Como **rececionista**, quero alterar as datas de uma reserva, para que o cliente possa mudar a sua estadia. Critérios de aceitação: aplicam-se as mesmas regras de datas da criação; o quarto tem de estar livre nas novas datas (a própria reserva não conta); o preço total é recalculado; não é possível alterar uma reserva com check-in já feito, nem uma cancelada.	3	Medium	Nuno
US25	Como **gestor**, quero criar e editar os serviços extra do hotel, para que possam ser adicionados às reservas com o preço certo. Critérios de aceitação: existe a tabela de serviços na base de dados; cada serviço tem uma designação, um preço e um tipo de cobrança (por noite, por estadia ou por utilização); não é possível guardar um preço negativo; não é possível criar dois serviços com a mesma designação; é possível desativar um serviço sem o apagar.	3	Medium	Guilherme
US31	Como **gestor**, quero desativar e reativar quartos, para que os quartos indisponíveis não sejam reservados. Critérios de aceitação: só o gestor tem acesso; um quarto desativado não aparece na pesquisa de disponibilidade; não é possível desativar um quarto com reservas futuras; o quarto não é apagado e pode ser reativado.	3	Medium	Nuno
US26	Como **rececionista**, quero carregar o ficheiro XML de uma entrega do fornecedor, para que seja validado antes de dar entrada no stock. Critérios de aceitação: o ficheiro é validado com o XSD antes de ser usado; um ficheiro inválido é recusado com uma mensagem que indica o erro; um ficheiro válido mostra a lista de materiais, quantidades e o fornecedor; as tabelas de fornecedor, material e entrega existem (script que pode correr várias vezes).	3	Medium	Guilherme
US32	Como **equipa**, queremos nomes coerentes nas camadas (XxxBLL, IXxxDAL e XxxDAL), para que o código siga a convenção acordada e os diagramas. Critérios de aceitação: as classes *Service passam a *BLL, e os *Repositorio e *RepositorioBD a I*DAL e *DAL; os nomes coincidem com o diagrama de classes e com o README.	2	Medium	Dinis
US33	Como **equipa**, queremos os diagramas atualizados, para que a documentação corresponda ao código. Critérios de aceitação: existe um diagrama de sequência detalhado (por exemplo, criar reserva); o diagrama de classes tem as classes novas (BLL/DAL, Sessao, Permissoes, reservas) e os atributos que faltam (passwordSalt, ativo, checkinEm, checkoutEm); os nomes coincidem com o código; os ficheiros editáveis e os PNG estão no repositório.	2	Medium	Dinis

Total comprometido: 26 story points em 9 user stories (7 em stories High e 19 em Medium).

Stories extra (product backlog)

Fora do compromisso. Entram na sprint se sobrar tempo, pela ordem da tabela; as que não entrarem ficam no topo do product backlog. O enunciado atribui a receção de sugestões e queixas ao gestor; propomos que o rececionista as registe e o gestor as consulte, por ser quem tem contacto com o cliente (a confirmar com o docente).

ID	User story e critérios de aceitação	Pontos	Prioridade
US23	Como **rececionista**, quero registar uma sugestão ou queixa de um cliente, para que chegue ao gestor. Critérios de aceitação: é possível escolher o tipo (sugestão ou queixa); a descrição é obrigatória; fica associada ao cliente pelo NIF; a data é registada automaticamente.	2	Medium
ID	**User story e critérios de aceitação**	**Pontos**	**Prioridade**
US24	Como **gestor**, quero consultar as sugestões e queixas dos clientes, para que possa melhorar o funcionamento do hotel. Critérios de aceitação: só o gestor tem acesso; a lista mostra a data, o tipo, o cliente e a descrição; é possível filtrar por tipo; a mais recente aparece primeiro.	2	Medium

Divisão por elemento e dependências

O trabalho de que os outros dependem é feito primeiro: a interface IReservaDAL (Tomás) no primeiro dia e o rename das classes (Dinis) na terça de manhã; as stories de que ninguém depende fazem-se ao fim de semana.

Elemento	Disponibilidade	User stories	Horas	Depende de
Dinis (TL)	Nas aulas e ao fim de semana	US32 Consistência de nomes · US33 Atualizar os diagramas	6 h	US33 depende da US27 e da US32
Guilherme	Semana e fim de semana	US25 Gerir serviços extra · US26 Validar o XML	8 h	US26 depende do XML e do XSD do docente
Tomás	Semana e fim de semana	US27 Criar reserva · US28 Consultar reservas de um cliente	10 h	US32 (rename), para editar ficheiros existentes
Nuno	Nas aulas e ao fim de semana	US31 Desativar e reativar quartos · US29 Cancelar reserva · US30 Alterar datas · revisão do SQL de todos os PRs	11 h	US29 e US30 dependem da IReservaDAL da US27; US31 depende da US32

Recursos de planeamento do sprint

Quadros e retrospetivas de sprint

Board da equipa (Trello): https://trello.com/b/VuxZ5qbj/lp3-g2


Listas do board: Product Backlog · To Do · Doing · Testing · Done S1 · Done S2 · Done S3


Cartões: título com o ID e os pontos; checklist de critérios de aceitação e checklist de tarefas (view FXML, testes unitários e Javadoc); prioridade (High, Medium, Low); estimativa e tempo gasto; etiqueta “Extra” nas stories fora do compromisso. Guardam-se prints do quadro no início e no fim da sprint.


Retrospetiva da Sprint 3: a 02/11, com o formato das aulas (continuar a fazer, parar de fazer, começar a fazer), as horas estimadas e as reais, e as stories não concluídas com a respetiva justificação.

Provas de Planeamento

Quadro do Trello no início da Sprint 3 (27/10/2026)

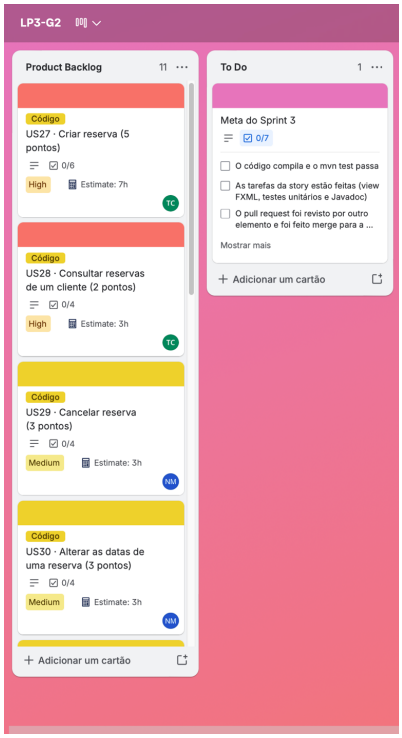

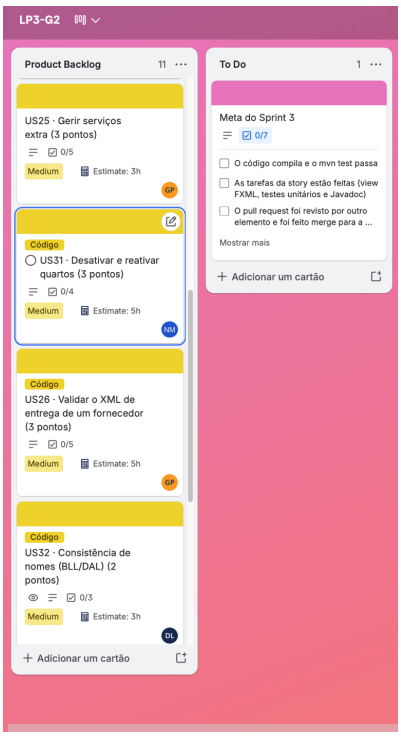

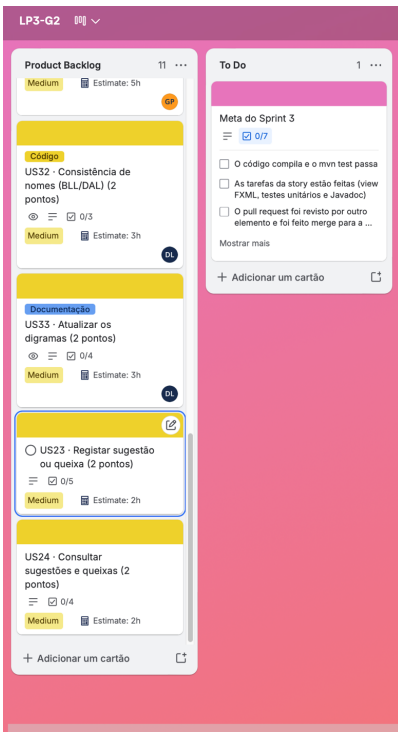

Recursos e definições da equipa

Enunciado: Enunciado LP3 v1.0 (07/10/2026)

Repositório Git: https://github.com/Guiizz/LP3-G2

Branches: feat-0XX-descrição ou fix-0XX-descrição, em minúsculas, com o número da story; pull request para a main (testes), revisto por outro elemento; a Quality (avaliada) só recebe alterações da main, no fim da sprint, por merge commit.

Commits: mensagens claras e sucintas que descrevem a alteração; não são aceites mensagens como “fix task” ou “general fix”.

Tecnologias: Java 17, JavaFX (FXML), SQL Server com JDBC, Maven, JUnit 5 e Javadoc; bibliotecas externas (driver do SQL Server, dotenv, validação XSD) só com justificação no README.
